ProjeART

- Estudos de Solos, Sondagens
- Estaqueamento, Obras de Arte
- Fundações em Geral
- Estruturas Diversas
- Consultorias

Cliente e Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | **Rel. No.:** FN1384-07

Local: Área situada na Av. Fernando Jogaib, Quadra 35, Loteamento Ayrton Senna, São Mateus - ES

Perfil no.: SP07 | **Início em:** 01/09/2012 | **Término em:** 01/09/2012

Cota: +0,28m

Sondador: Bruno Carvalho

Nível D'Água: Início seco em 01/09/2012 e confirmado após 24:00 horas. (medidos na boca do furo)

Perfil de Sondagem Geotécnica

——— SPT inicial
------ SPT final

Revestim.	Amostra	Profund. (m)	Classificação do Material	Número de golpes p/ cada 15cm		
2,00 metros 2 1/2		0,30	Areia fina e média, cor escura			
	01		Silte pouco argiloso, pouco arenoso, médio, cor amarela	3	4	5
	02			3	3	3
	03			3	4	4
	04	4,00	Silte pouco argiloso, pouco arenoso, de rijo a duro, cor variegada	3	6	8
	05	5,80		8	15	19
	06		Silte arenoso, pouco argiloso, de compacto a muito compacto, cor variegada	11	16	24
	07			10	14	22
	08	9,00		10	19	
	09		Silte arenoso, de compacto a muito compacto, cor branca	11	22	
	10	10,50	Silte arenoso, pouco argiloso, compacto, cor variegada	16	16	21
	11			13	15	20
	12	12,83	Silte pouco argiloso, pouco arenoso, duro, cor variegada	11	16	16
	13			10	15	19
	14			11	14	22
	15			12	16	24
			15,45 metros Limite da sondagem			
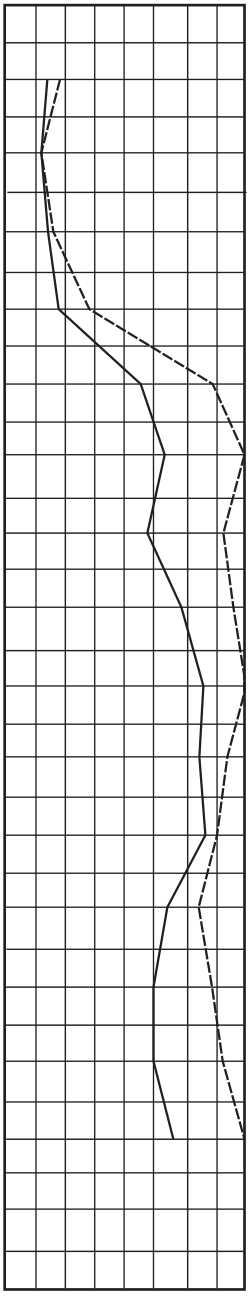
Número de golpes p/ os últimos 30cm
